

대병 하조항~원송마을 굴곡도로 선형개량

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
9	○				○				○			○	
담당부서	건설교통과 도로담당				담당자	권영민		전화번호	930-3472				

지방도1026호선은 노폭이 협소하여 차량 교행에 어려움이 있고, 선형 불량으로 인한 교통사고 발생 위험이 상존하여 개선이 필요함.

사업개요

- 사업명 : 대병 하조항~원송마을 굴곡도로 선형개량공사
- 위치 : 합천군 대병면 장단리 ~ 성리 일원
- 사업규모 : 도로선형개량 및 확포장 L=1.9km, B=8.5m
- 사업비 : 5,000백만원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2027년

지난 추진현황

- '23. 02월 : 조사측량 및 실시설계 용역 착수
 - ※ 2023년 당초예산 군비(5억원, 설계 및 보상비) 확보
- '23. 05월 : 도로 비관리청 허가 사전협의(경상남도)
- '23. 06월 : 주민설명회 개최
- '23. 10월 : 소규모 환경영향평가 등 인허가 관련 용역 시행
- '24. 04월 : 문화재(문화재청→합천군) 보존대책 통보
- '24. 05월 : 문화재 시굴조사 용역 시행
- '24. 06월 : 매장유산 발굴 허가 신청(국가유산청)
- '24. 06월 : 소규모 환경영향평가 협의 내용 회신(낙동강유역환경청)
- '24. 06월 : 매장문화재 발굴허가
- '24. 07월 : 매장유산 시굴 조사에 대한 주민 협의
- '24. 10월 : 비관리청 허가 사전 협의
- '24. 11월 : 보상계획 공고

금회 추진현황

- '25. 01월 : 보상 협의 실시
- '25. 02월 : 특별조정교부금 신청(상반기)
- '25. 03월 : 매장유산 발굴조사 용역 시행
- '25. 05월 : 매장유산 시굴 및 발굴조사 완료
- '25. 07월 : 특별조정교부금 신청(하반기)
- '25. 09월 : 비관리청 허가 방문 협의
- '25. 12월 : 26년 당초예산편성(5억)

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
비관리청 허가 협의											
감정평가 및 보상협의											
공사 계약 및 착공											2026~
공사완료											2027. 12

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
도로건설관리계획 반영	%	100	80	20	-	
보상완료	%	100	-	100	-	
공사완료	%	100	-		100	

문제점 및 조치계획

- 주민설명회 시 사업구간 연장 요청에 따른 사업계획 변경 검토 필요
 - ※ 당초 : 하조항~원송마을(L=1.9km) → 변경 : 하조항~용주면 경계지점(L=2.75km)
 - ⇒ 사업 시기 및 실시설계 과업 범위 등을 고려하여 별도 사업으로 추진 예정

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	5,000	0	1,000	4,000	0	
2022년	0					
2023년	500			500		
2024년	100			100		
2025년	1,200		1,000	200		
2026년	3,200			3,200		
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획 : 50억원(도비 10억원, 군비 40억원)

구분	확보계획
국비	
도비	특교세, 특별조정교부금 사업비 지원
군비	자체 예산 확보
기타	

주민소통 현황


연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 개최	사업추진 현황 설명 및 주민의견 수렴 → 사업구간 연장 건의	'23. 6월

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경상남도	도로과	파트장	김경조	055-211-5742	
경상남도	도로과	주무관	이규호	055-211-5745	

변경사항 : 해당사항 없음

□ 사업추진 관련 위치도 및 전경사진

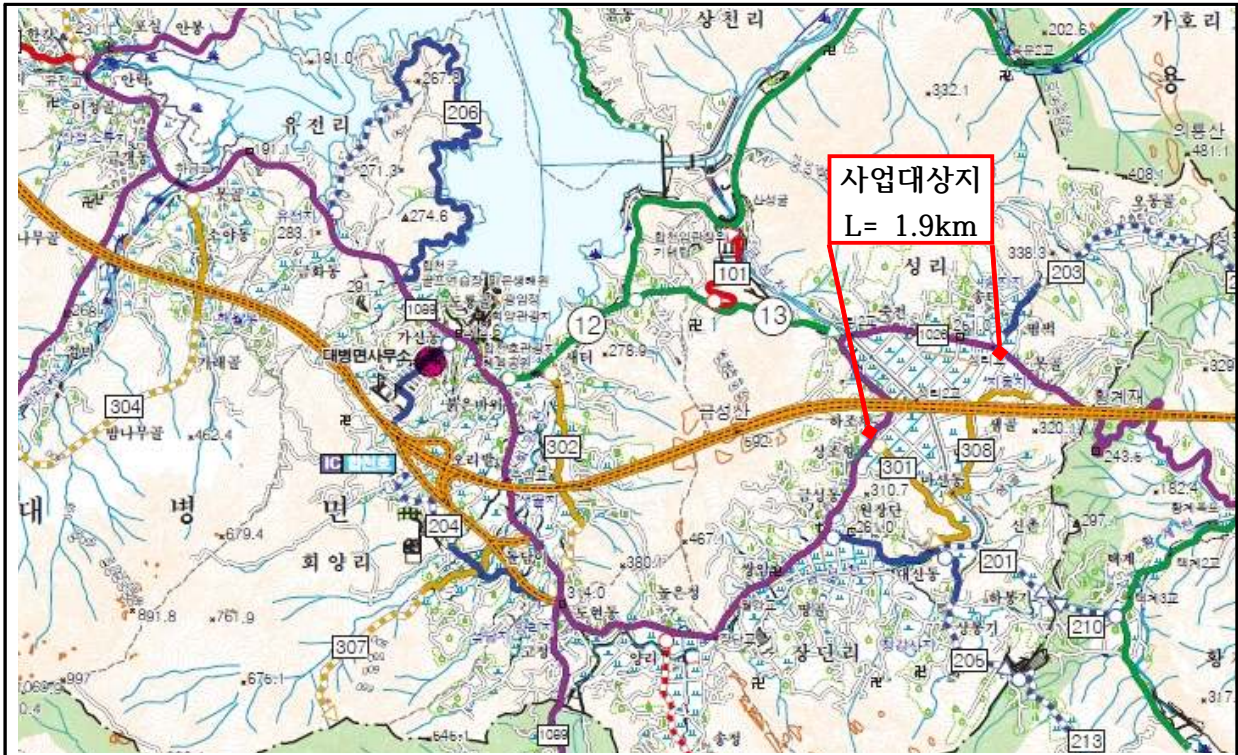

□ 사업추진 관련 추가 건의 위치도 및 전경사진

