

# 지방도1084호선(용계~덕암) 도로개설

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
5	○			○					○				○
담당부서	건설교통과 도로담당				담당자	조병기		전화번호		930-3472			

○ 합천군 합천읍 용계리~묘산면 거산리 간 지방도1084호선 도로건설 공사를 통해 편리한 교통 제공 및 대군민 화합 도모

※ 2021년 ~ 2025년 경상남도 도로건설·관리계획 투자우선순위 4위

## 사업개요

- 사업명 : 지방도1084호선(용계~덕암) 도로개설사업
- 위치 : 합천군 합천읍 용계리 ~ 묘산면 거산리 일원
- 사업규모 : 도로개설 L=7.95km(2차로, 터널 L=1.0km 포함)
- 사업비 : 71,584백만원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2029년(6년간)

## 지난 추진현황

- 2021. 12. : 2021년 ~ 2025년 경상남도 도로건설관리계획 고시
- 2022. 11. : 타당성 기초조사 용역 시행(합천군, 중지 중)
- 2022. 12. : 타당성 조사 시행(경남도, 중지 중)  
 ※ 수행기관 : 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터(LIMAC)
- 2023. 1. : 현지 조사 및 착수 보고(경남도+합천군+리맥)
- 2023. 5. : 타당성 조사 중간 보고(낮은 경제성 및 사업목적 불명)
- 2023. 5. : 타당성 조사 중지 요청(사업의 필요성 및 명분 입증 필요)
- 2023. 6. : 해인사 및 지역(가야아로,묘산합천) 주민(1,000여명) 사업건의서 제출
- 2023. 7. : 사업건의서 등 정책적 자료 보완 제출(합천군→경상남도)
- 2023. 12. : 타당성 조사 최종 보고회 개최

## 금회 추진현황

- 2024. 4. : 실시설계 등 사업 조기 착수 건의(군수님→도지사님)

## 연차별 세부추진계획

- 2024. 10. : 투자심사 의뢰(경남도 교통건설국 → 예산담당관실)
- 2025. 1. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2025. 9. : 도로구역 결정 고시 및 보상협의 완료
- 2025. 10. : 공사 계약 및 착공
- 2029. 12. : 공사 완료 예정

## 문제점 및 조치계획

- 타당성 조사 결과에 따른 비용편익 분석 결과가 낮을 시(B/C=1이하)  
투자심사 통과 애로(경제성 분석 결과 B/C=0.25)  
→ 지역 간 균형발전 및 도로 이용 편익 증진을 위해 반드시 필요한  
사업으로 투자심사 반영 등 지속적인 사업 시행 건의  
→ 사업추진 애로 시 국도24호선 마령재 터널개설 등 다각적인 방안 모색
- 도정 사업으로 능동 대처 애로
  - 중장기적 대응 필요

## 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	71,584	0	71,584	0	0	
2022년	0	-	-	-	-	
2023년	0	-	-	-	-	
2024년	2,070	-	2,070	-	-	
2025년	11,220	-	11,220	-	-	
2026년	12,390	-	12,390	-	-	
2027년 이후	45,904	-	45,904	-	-	

## 예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 715억원 (도비 715억원)

구분	확보계획
국비	
도비	자체 도비 확보
군비	
기타	

## 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	사업설명 및 현장확인	경상남도, 합천군, 한국지방행정연구원 타당성조사 시행에 따른 사업설명 및 질의, 현장확인 : 23. 1. 4	
2	주민사업건의	북부지역(가야,야로,묘산) 주민 사업건의서 제출 협조 요청 등 : 23. 5.18	
3	해인사 사업 건의	해인사 방문 및 주지 스님 면담 등(건의서 제출): 23. 6. 13	



## 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	도로과	파트장	김선주	055-211-5722	
도	도로과	주무관	주형근	055-211-5726	

## 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 604억원</li> <li>· 사업량 : L=7.66km</li> <li>· 사업기간 : 2023년 ~ 2029년</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 변경내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 715억원</li> <li>- 사업량 : L=7.95km</li> <li>- 사업기간 : 2024년 ~ 2029년</li> <li>- 사유 : 타당성 조사 결과보고서 반영</li> </ul> </li> </ul>

# □ 사업추진 관련 사진

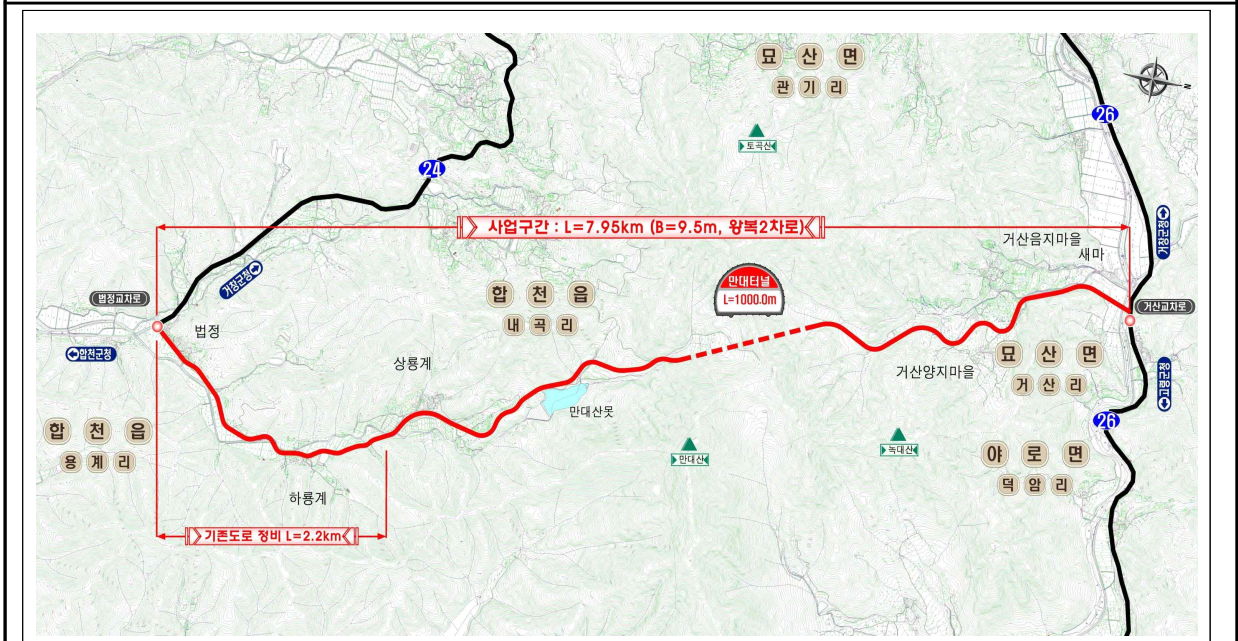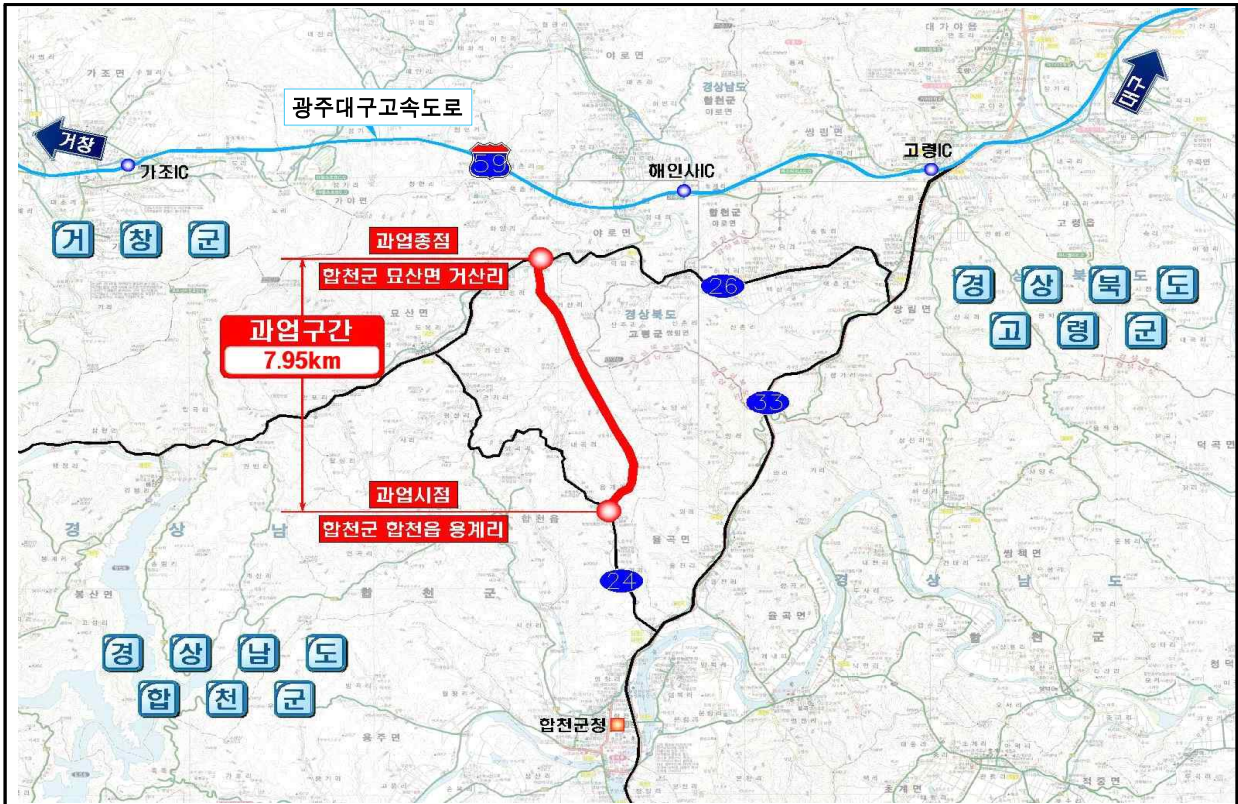

< 계획평면도 >

