

소리길 입구~가야시장 도로개선

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
7	○				○				○			○	
담당부서	건설교통과 지역개발담당				담당자	박소현		전화번호	930-3412				

- 가야소리길 입구에서 가야시장을 연결하는 도로개설 및 주변 환경 정비를 통하여 소리길을 찾아오는 방문객들에게 편의시설을 제공하고 가야시장 방문을 유도하여 지역 상권 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명 : 소리길 입구~가야시장 도로개선사업
- 사업위치 : 가야면 황산리 340-2번지 일원
- 사업내용 : 테마길 조성 L=0.5km
- 도로개설 L=0.25km, 도로정비 L=0.25km
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 1,000백만원

□ 지난 추진현황

- 사업 실시계획 수립 용역 시행 : 2023. 2.
- 사업 계획 및 편입 토지 관련 주민 협의 : 2023. 2.
- 가야천 하천기본계획 변경에 따른 설계용역 중지 : 2023. 3.
- 실시설계(안)에 대한 주민 협의 : 2023. 10.
- 2024년 당초예산 확보(보상비 300백만원) : 2023. 12.

□ 금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

- 편입토지(안) 사전 보상협의 : 2024. 7.
- 편입토지(안) 감정평가 시행 : 2024. 7.

□ 연차별 세부추진계획

- 2024년 하반기 특별교부세 신청 : 2024. 9.
- 가야천 하천기본계획 변경고시(경상남도) : 2024. 10.
- 보상협의 시행 : 2024. 10.
- 관련 인허가(하천점용 등) 협의 : 2024. 10.
- 공사 계약 및 사업 착수 : 2025. 1.
- 사업 준공 : 2025. 12.

□ 문제점 및 조치계획

- 당초 1차선 시장진입로 도로 개설로 계획되었으나, 주민 협의 결과 지역경제 활성화 목적으로 추진하는 사업이므로 2차선 규모의 도로 개설이 요구됨에 따라 공사비 및 편입 토지 및 지장물(가야정미소) 보상비 등 소요 사업비 증가 예상

→ 농식품부 2022년 1차 농촌공간정비 공모사업 선정으로 경제문화국 미래성장활력과에서 추진 중인 가야면 사촌지구 농촌공간 정비사업 (2024. 8. 기본계획 승인 및 2025. 5. 사업 착수예정)에 가야정미소에 대한 철거 및 보상비 반영(320백만원)

→ 2024년 하반기 특별교부세 지원 신청하여 소요되는 준비 절감 노력

- 사업구역 연접 시설인 가야천 하천기본계획 변경 고시가 2024. 5.로 예정되었으나, 2024. 10.로 변경(예정)됨에 따른 본 사업 추진 지연

→ 사업계획 수립 전 편입 토지(안)에 대한 사전 주민 협의를 통해 보상 협의기간 단축 노력

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,000	700	0	300	0	
2022년	0					
2023년	0					
2024년	1,000	700	-	300	-	
2025년	0					
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 1,000백만원(국비 700백만원, 군비300백만원)

구분	확보계획
국비	700백만원(특별교부세)
도비	
군비	300백만원
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	실시설계용역 주민 설명회 (2023.02.21.)	<ul style="list-style-type: none"> 설계용역 착수 안내 및 사업계획 협의 → 당초 1차선 시장진입로 도로 개설로 계획되었으나, 주민 협의 결과 지역경제 활성화 목적으로 추진하는 사업이므로 2차선 규모의 도로 개설이 요구되어 공사비 및 편입 토지 및 지장물(가야 정미소) 보상비 등 소요 예산 증가 예상 	- 가야 황산이장 외 6명
2	실시설계(안) 주민협의 (2023.10.19.)	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계(안)에 대한 주민협의 → 개설 도로 및 인도에 대한 규격, 선형 협의 → 편입 토지 및 지장물 보상 협의 협조 요청 	- 가야 황산이장 외 4명
3	실시설계(안) 주민협의 (2024.07.12.)	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계(안)에 대한 사전 보상협의 → 편입 토지 필지별 소유자 확인 및 개인별 사전 보상 협의 요청 	- 가야 황산이장 외 5명

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	예산담당	주무관	강민경	055-211-2426	


변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none">· 사업비 확보 : 1,000백만원- 자체예산(군비) 100%	<ul style="list-style-type: none">· 사업비 확보 : 1,000백만원- 2024년 하반기 특별교부세(현안수요) 사업 신청 (2024. 9.)[특별교부세 700백만원, 자체 300백만원]

□ 사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장, 협약식 등)



사업 위치도

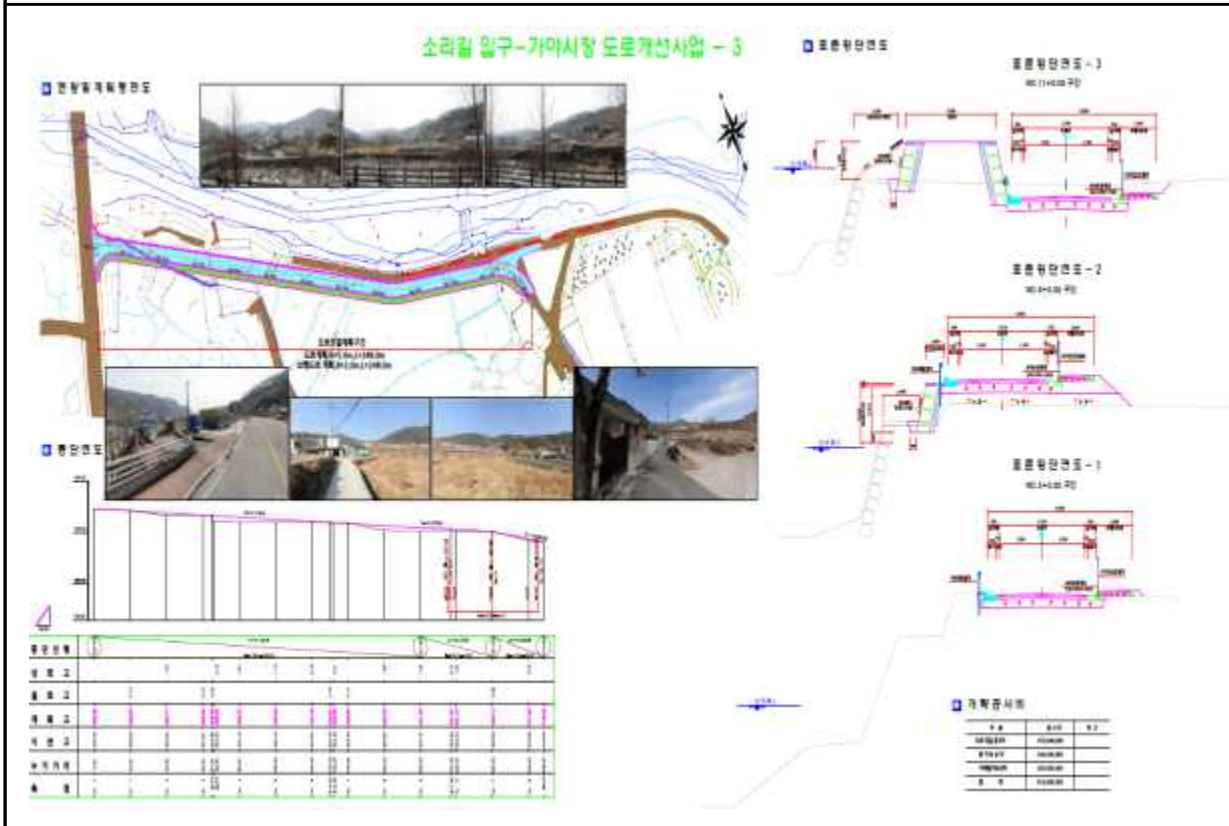

사업 계획(안) (2023.10.)

□ 사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장, 협약식 등)



실시설계용역 착수 안내 및 사업계획 주민협의(2023.02.21.)



실시설계(안)에 대한 주민협의(2023.10.19.)

□ 사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장, 협약식 등)



실시설계용역(안)에 대한 사전 보상협의(2024.07.12.)
