

대병 하조항~원송마을 굴곡도로 선형개량

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
9	○				○				○			○	
담당부서	건설교통과 도로담당				담당자	조병기		전화번호		930-3472			

○ 지방도1026호선은 노퍽이 협소하여 차량 교행에 어려움이 있고, 선형 불량으로 교통사고 발생 위험이 상존하여 개선이 필요함.

사업개요

- 사업명 : 대병 하조항~원송마을 굴곡도로 선형개량공사
- 위치 : 합천군 대병면 장단리 ~ 성리 일원
- 사업규모 : 도로선형개량 및 확포장 L=1.9km, B=8.5m
- 사업비 : 5,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

지난 추진현황

- 2023. 2. : 조사측량 및 실시설계 용역 착수
※ 2023년 당초예산 군비(5억원, 설계 및 보상비) 확보
- 2023. 5. : 도로 비관리청 허가 사전협의(경상남도)
- 2023. 6. : 주민설명회 개최
- 2023. 10. : 소규모 환경영향평가 등 인허가 관련 용역 시행

금회 추진현황

- 2024. 4. : 문화재(문화재청→합천군) 보존대책 통보
- 2024. 5. : 문화재 시굴조사 용역 시행
- 2024. 6. : 매장유산 발굴 허가 신청(국가유산청)
- 2024. 6. : 소규모 환경영향평가 협의 내용 회신(낙동강유역환경청)
- 2024. 6. : 매장문화재 발굴허가

연차별 세부추진계획

- 2024. 7. : 매장유산 시굴 조사에 대한 주민 협의
- 2024. 10. : 비관리청 허가 및 도로구역 결정 등 각종 인허가 협의 완료
- 2024. 11. : 감정평가 및 보상협의 이행
- 2025. 3. : 공사 계약 및 착공
- 2025. 12. : 사업 준공 및 도로 개통

문제점 및 조치계획

- 주민설명회 개최 시 사업 구간 연장 요청에 따른 사업계획 변경 검토 필요
※ 당초 : 하조항~원송마을(L=1.9km) → 변경 : 하조항~용주면 경계지점(L=2.75km)
⇒ 사업 시기 및 실시설계 과업 범위 등을 고려하여 별도 사업으로 추진 예정

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	5,000	0	2,000	3,000	0	
2022년	0					
2023년	500			500		
2024년	1,100		1,000	100		
2025년	3,400		1,000	2,400		
2026년	0					
2027년 이후	0					

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 50억원(도비 20억원, 군비 30억원)

구분	확보계획
국비	
도비	특교세, 특별조정교부금 사업비 지원
군비	자체 예산 확보
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 개최	사업추진 현황 설명 및 주민의견 수렴 → 사업구간 연장 건의	2023. 6.


소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	도로과	파트장	최문수	055-211-5752	
도	도로과	주무관	이상훈	055-211-5753	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
.	. 해당없음

□ 사업추진 관련 위치도 및 전경사진

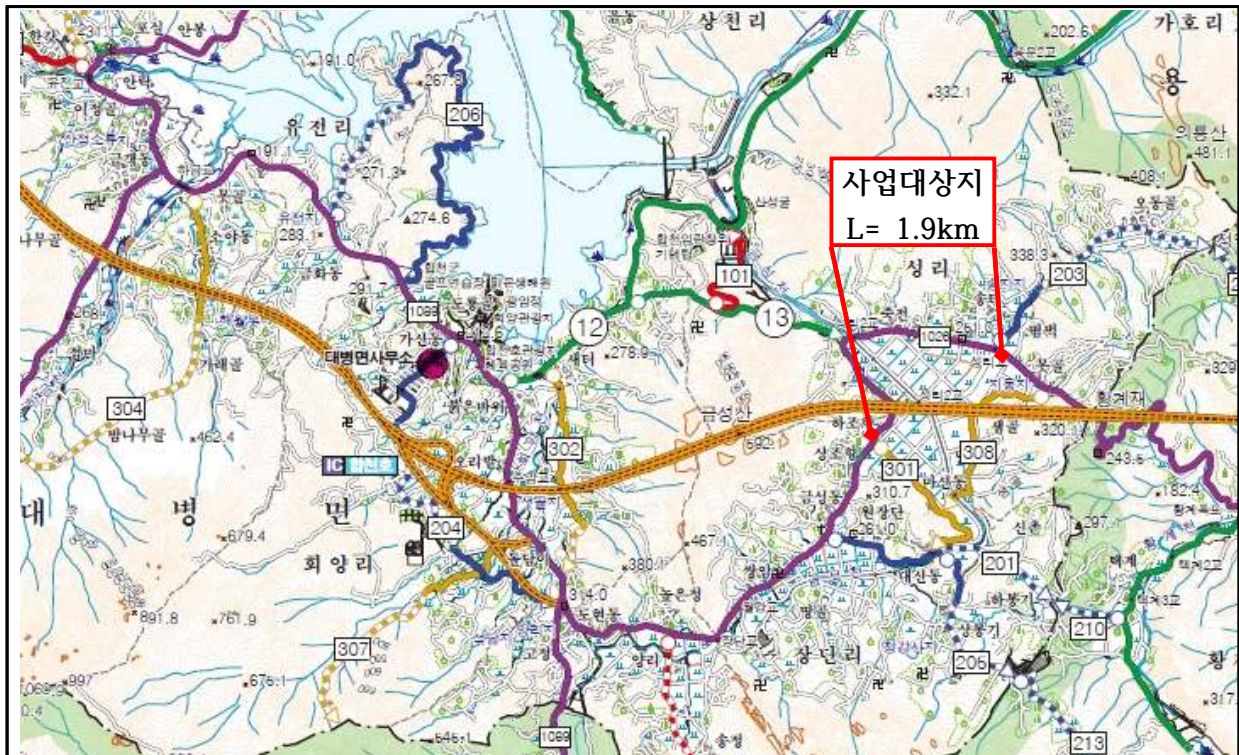

□ 사업추진 관련 추가 건의 위치도 및 전경사진

